



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

PNC

Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR

Report n. 3: adempimenti e attività al 31 marzo 2022

2020

2021

2022

2023



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 3: adempimenti e attività al 31 marzo 2022

INDICE

CAPITOLO 1 - Aggiornamenti e informazioni relative allo stato di avanzamento	1
CAPITOLO 2 - I trimestre 2022 - Il dettaglio.....	3
CAPITOLO 3 - Allocazione territoriale delle risorse ripartibili del PNC	5
Allegato 1	7
Programmi e interventi del PNC.....	7
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.....	7
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016.....	7
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	7
B.1.2 - Rilancio economico e sociale	8
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	8
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi.....	8
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:.....	8
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi.....</i>	<i>8</i>
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>	<i>8</i>
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:.....	8
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi.....</i>	<i>8</i>
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	<i>9</i>
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:	9
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i>	<i>9</i>
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln).....</i>	<i>9</i>
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	9
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:.....	10
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:	10
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri.....</i>	<i>10</i>
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari.....</i>	<i>10</i>
C.4.2 - Mezzi intermodali:.....	11
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	<i>11</i>
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):	11
C.5.1 - Ponti e viadotti.....	11
C.5.2 - Smart Road.....	11
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	12
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale.....	12
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	12
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale	12

C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	12
C.10 - Efficiamento energetico	13
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	13
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne	13
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	13
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	14
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:	14
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	14
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	15
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima.....	15
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.....	15
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.....	15
E.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	15
E.3 - Ecosistema innovativo della salute.....	16
F.1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale	17
F.3 - Accordi per l'Innovazione	18
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori	18
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni “modello” per detenuti adulti	18
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	18
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.....	19
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale..	20


CAPITOLO 1 - Aggiornamenti e informazioni relative allo stato di avanzamento.

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al primo trimestre dell'anno 2022 per l'attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come individuati nell'Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021.

L'aggiornamento è stato predisposto sulla base delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni titolari degli investimenti.

In via preliminare si riporta nella figura 1 di seguito un grafico di sintesi degli obiettivi e degli adempimenti previsti per l'intero anno 2022.


Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

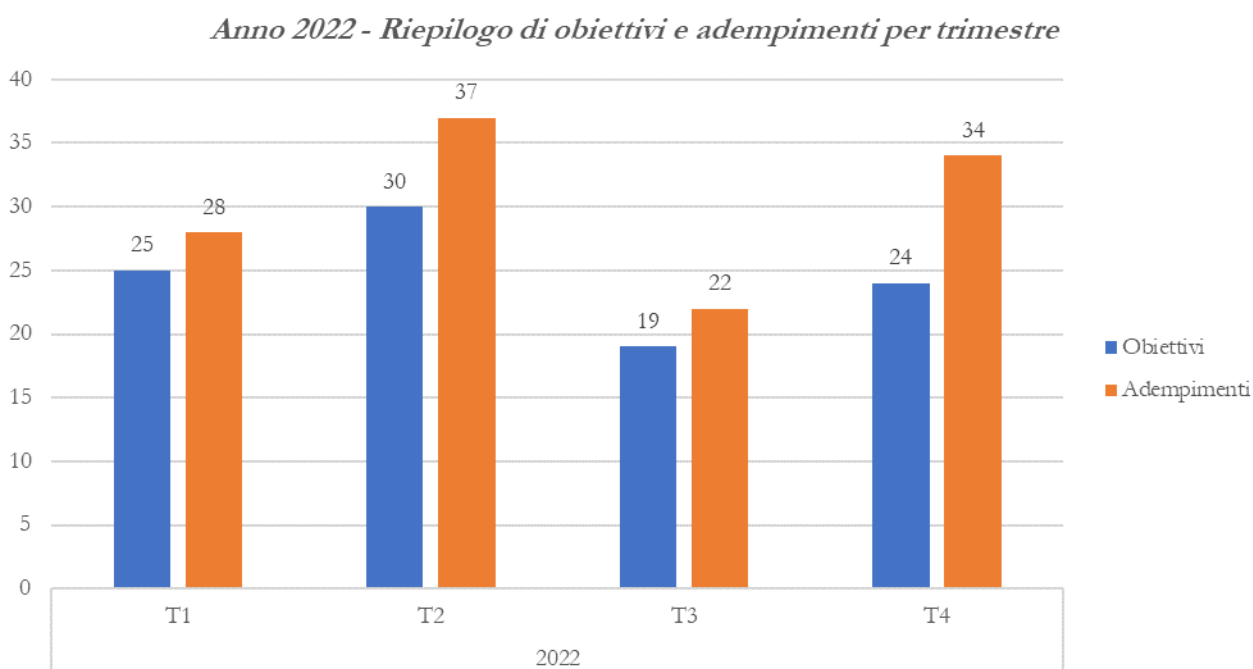

CAPITOLO 2 - I trimestre 2022 - Il dettaglio

Come emerge dalla Figura 1, alla scadenza del 31 marzo 2022 (T1 2022), nel DM MEF sono previsti 25 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come da Figura 2.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

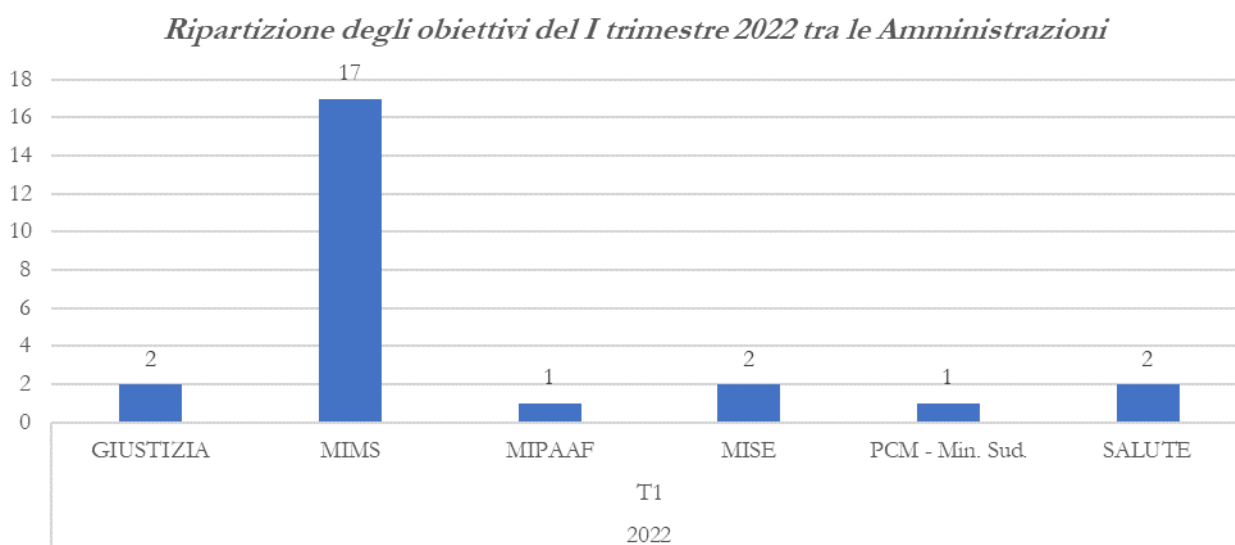

Gli obiettivi relativi al presente trimestre risultano tutti conseguiti, ad eccezione di quelli di seguito rappresentati.

- **Obiettivi parzialmente conseguiti:**

- o *PCM - Ministro per il Sud* - Per il programma [A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati](#) non è stato ancora adottato il provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti. L'amministrazione prevede di recuperare il ritardo entro il prossimo trimestre nel quale, oltre ad adottare il citato atto, stipulerà le convenzioni per la concessione delle sovvenzioni.
- o *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* - Per l'intervento [C.4.1.1 - Locomotori e carri](#) seppure il bando sia stato predisposto non si è ancora proceduto alla pubblicazione in assenza della formale autorizzazione da parte della Commissione europea, con la quale sono in corso interlocuzioni che dovrebbero, secondo il MIMS, concludersi nel mese di aprile.
- o *Ministero della salute* - Con riferimento al programma- [E.3 - Ecosistema innovativo della salute](#), in data 30/03/2022 è stato adottato il D.D. del DGRIC concernente l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'attuazione di interventi da finanziare nell'ambito dell'iniziativa. Tale provvedimento ha però rivelato l'esigenza di alcune modifiche per le quali sono in corso interlocuzioni.

- **Obiettivi non conseguiti:**

- o *Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali* - Per il programma [H.1 Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo](#), il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto è dovuto alla


mancata pubblicazione dei bandi per i settori della pesca e dell'acquacoltura e forestale. A ciò si aggiunge il mancato recupero del ritardo sul trimestre precedente in quanto il nuovo bando per il settore agroalimentare (e florovivaistico) non è stato ancora pubblicato.

- o *Ministero per lo sviluppo economico* - Per il programma [F.1 "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale](#), il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto alla mancata pubblicazione dei bandi di gara previsti, e al mancato recupero del ritardo sul trimestre precedente, in quanto non è ancora pervenuto il riscontro definitivo da parte della Commissione europea. In assenza della relativa autorizzazione unionale, infatti, non si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara.

In merito ai due obiettivi non conseguiti le amministrazioni titolari hanno rappresentato di poter provvedere a recuperare il ritardo e a porre in essere gli adempimenti previsti in tempi brevi, comunque entro la scadenza successiva, senza pregiudizio per le future scadenze.

Di seguito una rappresentazione grafica dello stato di realizzazione degli obiettivi.

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

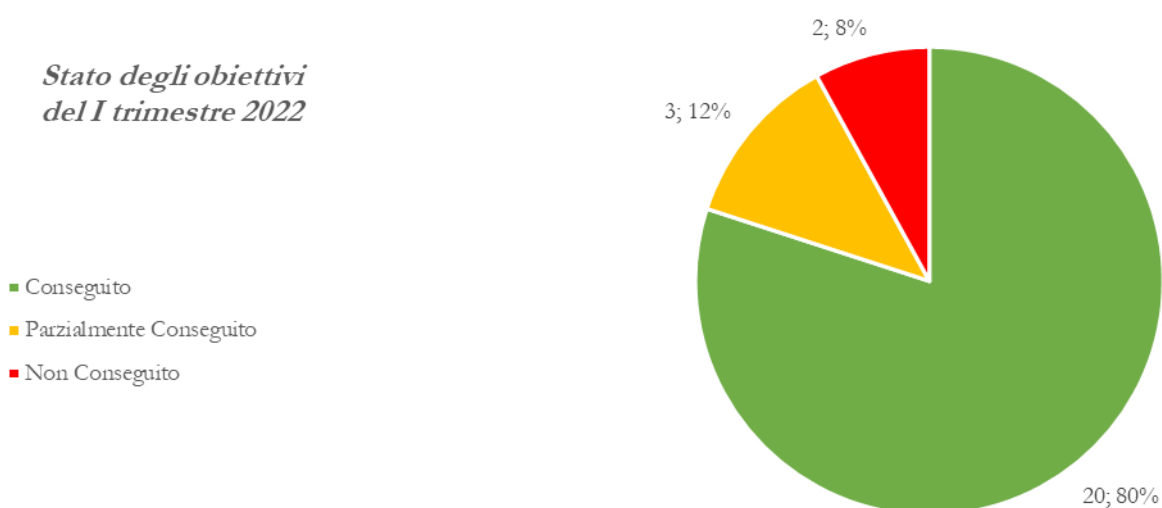

Il quadro di dettaglio per il I trimestre 2022, con separata evidenza – per ogni obiettivo collegato ad ogni singolo intervento – dello stato di tutti gli adempimenti previsti, è contenuto nella tabella di cui all'[allegato 1](#), redatta sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni interessate. La struttura del report è graficamente predisposta per evidenziare i programmi e le relative suddivisioni:

- **Programma**
- Investimento
- *Intervento*

Le informazioni relative agli obiettivi e agli adempimenti sono associate al livello di suddivisione più basso, ove esistente.

CAPITOLO 3 - Allocazione territoriale delle risorse ripartibili del PNC

Si riporta di seguito una prima rappresentazione grafica della distribuzione regionale delle risorse – 19,37 miliardi di euro circa – dei programmi indicati nel DM MEF del 15 luglio 2021.

Si tratta di una approssimazione della distribuzione territoriale delle risorse già ripartite – per circa 11,3 miliardi di euro - al netto, pertanto, delle risorse – circa 8,1 miliardi di euro - il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono territorialmente ripartibili ex ante.

Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

Rappresentazione grafica della ripartizione a livello regionale delle risorse dei programmi di cui al DM MEF del 15.07.2021 in mld/€


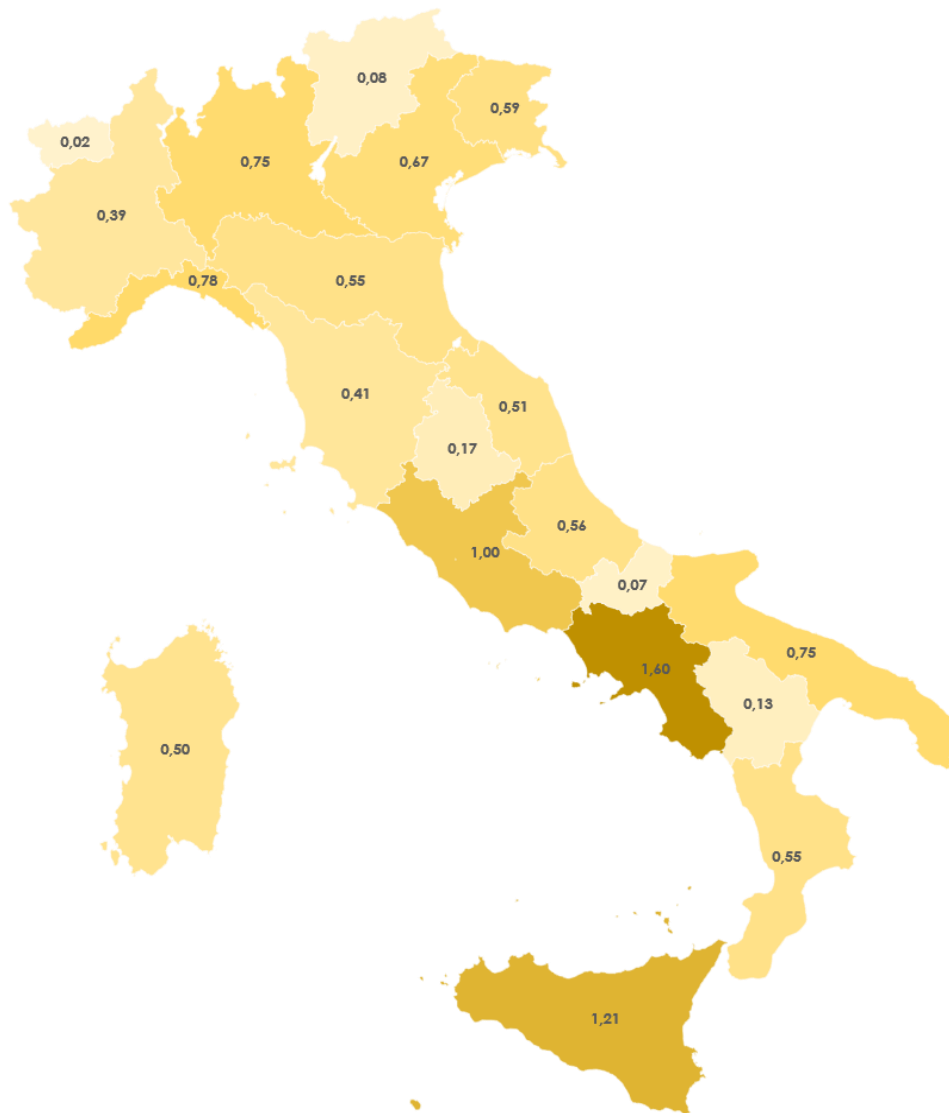


Tabella di ripartizione a livello regionale delle risorse dei programmi di cui al DM MEF del 15.07.2021 in mld/€

Regione	Mld/€
Abruzzo	0,56
Basilicata	0,13
Calabria	0,55
Campania	1,60
Emilia-Romagna	0,55
Friuli-Venezia Giulia	0,59
Lazio	1,00
Liguria	0,78
Lombardia	0,75
Marche	0,51
Molise	0,07
Piemonte	0,39
Puglia	0,75
Sardegna	0,50
Sicilia	1,21
Toscana	0,41
Trentino-Alto Adige	0,08
Umbria	0,17
Valle d'Aosta	0,02
Veneto	0,67
Totale ripartiti	11,29
Da ripartire/Non ripartibili	8,08
Totale DM MEF	19,37

*Risorse dei programmi di cui al DM MEF 15.07.2021
ripartite per area geografica
(dati in mld/€ e in percentuale)*

- CENTRO
- NORD
- SUD

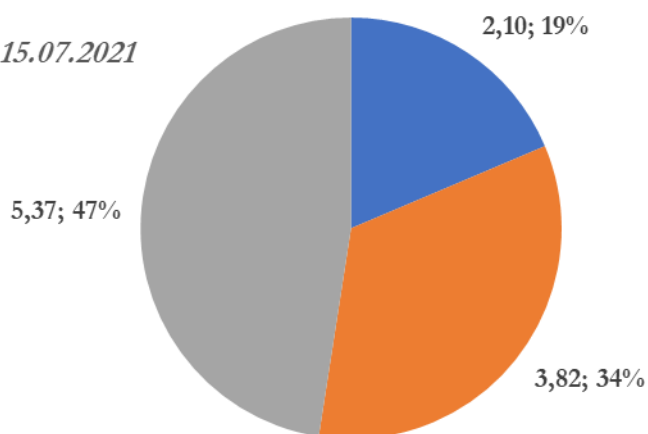

Allegato 1

Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	PCM: Min. Sud	350,00	Provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti	Parzialmente conseguito. Dato l'alto numero di progetti presentati sono ancora in corso le verifiche di ammissibilità. L'amministrazione, tuttavia, prevede di recuperare il ritardo entro la prossima scadenza e stipulare le convenzioni per la concessione delle sovvenzioni.	II/2022 Stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016					
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.	1.080,00	Nessun adempimento		II/2022 Approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009)

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1.2 - Rilancio economico e sociale		700,00	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione degli avvisi pubblici/bandi da parte dei soggetti attuatori.
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIMS	600,00	Erogazione anticipazione ai soggetti beneficiari	Conseguito. Effettuate anticipazioni delle erogazioni ai soggetti beneficiari. D.D. del 22.03.22, n. 107.	III/2022 Sottoscrizione dei contratti
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi					
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:					
C.2.1.1 - <i>Upgrading nuove navi</i> C.2.1.2 - <i>Retrofit Navi</i>	MIMS	500,00	Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento	Conseguito. Decreto interministeriale del 12.10.2021, n. 389, per l'individuazione dei criteri di ammissibilità al finanziamento.	III/2022 Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					
C.2.2.1 - <i>Acquisto navi</i>	MIMS	60,00	Pubblicazione del bando di gara per	Conseguito.	II/2022 Aggiudicazione gara per

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			acquisto delle 3 nuove unità navali veloci	Gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci pubblicata in Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 28.12.2021, n. 252. Pubblicato altresì in GURI 5° serie speciale n. 3 del 07.01.2022.	acquisto delle 3 nuove unità navali veloci
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	MIMS	20,00	Nessun adempimento	La nave Iginia è già entrata in servizio il 7 marzo 2022. Il bando relativo alla seconda nave è stato pubblicato in data 03/08/2021 (Gara DAC.0160.2021). Termine di presentazione dell'offerta 08/10/2021. È in corso la valutazione delle offerte pervenute. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 22.03.22.	II/2022 Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghettamento treni
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:					
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i> <i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)</i>	MIMS	220,00	Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento	Conseguito. Decreto interministeriale del 12.10.2021, n. 388, per l'individuazione dei criteri di ammissibilità al finanziamento.	III/2022 Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	MIMS	1.550,00	D.D. di trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione alle regioni. Pubblicazione dei	Conseguito. Adottato D.D. del 15.02.22, n. 13, di trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione alle regioni.	IV/2022 Stipula contratti per il 38% dei lavori. Avvio del 38% dei lavori. Pubblicazione bando del 100% dei lavori

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			bandi di gara per il 38% dei lavori	Publicati bandi di gara per il 44% dei lavori.	
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:					
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:					
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIMS	115,00	Avvio della procedura di concessione dei contributi	Parzialmente conseguito. In attesa di autorizzazione UE. SA.64726 (DI MIMS-MEF n.395 del 13.10.2021) A seguito della pre-notifica effettuata il 9 settembre 2021, vi sono state interlocuzioni e scambi di informazioni tra il team istruttorio e la Direzione Generale con l'assistenza di DPE e Rappresentanza Permanente in data 23 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022. Allo stato non è ancora stato adottato un provvedimento di autorizzazione formale da parte della Commissione Europea. Il bando è stato predisposto ma la pubblicazione avverrà dopo l'autorizzazione UE.	II/2022 Individuazione beneficiari locomotori e carri
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIMS	30,00	Nessun adempimento		II/2022 Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.4.2 - Mezzi intermodali:					
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	MIMS	55,00	Avvio della procedura di concessione dei contributi	Conseguito. Pur non essendo ancora pervenuta la autorizzazione da parte dell'UE il bando per la concessione dei contributi è stato pubblicato in data 4 marzo 2022 corredato dalle necessarie clausole di sospensione dell'efficacia fino all'autorizzazione in quanto il MIMS ha riferito di avere un accordo con la DG Comp sul merito delle misure notificate.	II/2022 Individuazione beneficiari locomotori e carri
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):					
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIMS	1.000,00	Avvio della procedura di affidamento per operazioni di monitoraggio dinamico	Conseguito. Bando e progetto di monitoraggio dinamico predisposti e approvati con determina a contrarre del commissario firmata in data 22.12.2021. Bando pubblicato: il 27.12.2021 su GUUE; il 29.12.2021 su GURI. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il 15.02.2022. È in corso la procedura di valutazione delle offerte.	II/2022 Aggiudicazione del contratto per le attività di monitoraggio dinamico
C.5.2 - Smart Road	MIMS		Nessun adempimento		II/2022 Aggiudicazione del contratto

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIMS		Nessun adempimento		IV/2022 Pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIMS	450,00	Nessun adempimento		II/2022 - Decreto direttoriale di approvazione dei Piani operativi predisposti da Anas; - Protocolli d'intesa di approvazione dei Piani operativi predisposti dai gestori delle tratte autostradali
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIMS	1.470,00	Trasferimento risorse a soggetti attuatori	Conseguiti. È stato eseguito il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori.	II/2022 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori.
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale	MIMS	390,00	Trasferimento risorse a soggetti attuatori		II/2022 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIMS	250,00	Trasferimento risorse a soggetti attuatori		II/2022 Pubblicazione da parte delle

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori
C.10 - Efficiamento energetico	MIMS	50,00	Trasferimento risorse a soggetti attuatori		II/2022 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	MIMS	700,00	Trasferimento risorse a soggetti attuatori		II/2022 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori.
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne	MIMS	300,00	Predisposizione, da parte dei S.A., dei Piani operativi di intervento	Conseguito. Tutte le regioni, le province e le città metropolitane hanno proceduto ad immettere i dati relativi ai programmi nel sistema informativo del MIMS.	II/2022 Approvazione dei Piani di intervento da parte delle Autorità centrali
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIMS	2.000,00	Trasmissione della Programmazione degli interventi da parte delle Regioni al MIMS e al Dipartimento Casa Italia con conseguente	Conseguito. Le regioni e le province autonome hanno predisposto il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo	II/2022 Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			adozione del Decreto MIMS, di concerto con Casa Italia, di approvazione della Programmazione. Individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte delle Regioni.	CUP e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'approvazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, ha proceduto all'approvazione del Piano degli interventi con D.D. del 30 marzo 2022, n. 52. Sono state altresì individuate tutte le stazioni appaltanti.	
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione dei Bandi di gara per appalto lavori e servizi per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:					
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	Pubblicazione bando per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA).	Conseguito. Pubblicato l'avviso pubblico in data 31/03/2022. Portale gare d'appalto Avvisi pubblici scaduti (iss.it)	II/2022 Provvedimento di assegnazione delle risorse per la realizzazione delle opere di istituzione/rafforzamento di strutture nazionali, regionali e territoriali con competenze e responsabilità specifiche in salute-ambiente-clima (Piano di azione SNPS SNPA);

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					provvedimento di istituzione del SNPS.
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	Nessun adempimento		IV/2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati.
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	Nessun adempimento		II/2022 Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS; provvedimento di istituzione del SNPS
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione bando
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	Nessun adempimento		II/2022 Piano di azione MdS-ISS
E.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	Nessun adempimento	Il Decreto del Ministro della Salute 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province Autonome per la realizzazione degli interventi a regia del Ministero della Salute, ivi compresi quelli di cui all'intervento "Verso un ospedale sicuro e	II/2022 Decreto ministeriale di approvazione del piano d'azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				sostenibile". Il Decreto stabilisce, inoltre, che ai fini dell'assegnazione delle risorse è necessario che Regioni e Province Autonome sottoscrivano il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) con il Ministero della Salute di cui sono parti integranti le schede intervento e i Piani Operativi Regionali, che le Regioni e le province autonome hanno compilato mediante la piattaforma informatica messa a disposizione da AGENAS. L'obiettivo di cui al II/2022 sarà raggiunto con la sottoscrizione dei 21 Contratti istituzionali di Sviluppo, con allegati le schede intervento e i Piani Operativi Regionali. Tale sottoscrizione avverrà entro il 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2022.	
E.3 - Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	Perfezionamento del decreto di approvazione della procedura ad evidenza pubblica	<p>Parzialmente conseguito.</p> <p>Adottato con D.D. del DGRIC in data 30/03/2022 l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'attuazione di interventi da finanziare nell'ambito dell'iniziativa "Ecosistema innovativo della Salute" del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Trasmesso agli organi di controllo in data 31/03/2022.</p> <p>L'avviso riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore; - il rafforzamento dei Life Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria. <p>Quanto alla creazione di un Polo Anti-Pandemia</p>	<p>II/2022</p> <p>Pubblicazione ed espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore; - il rafforzamento dei Life Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria; - la creazione di un Polo Anti-Pandemia.

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>l'art. 1 comma 949 della legge di bilancio 2022 prevede che Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub anti-pandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute», restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.</p> <p>L'obiettivo è stato ritenuto parzialmente conseguito in quanto risultano in corso modifiche al provvedimento adottato.</p>	
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MISE	800,00	Pubblicazione dei bandi di gara Obiettivo del IV/2021 in ritardo: autorizzazione UE.	<p>Non conseguito.</p> <p>I bandi non risultano pubblicati Non risulta recuperato inoltre il ritardo relativo all'obiettivo del IV/2021, concernente l'autorizzazione UE.</p>	II/2022 Aggiudicazione gare appalto

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MISE	1.000,00	Adozione Decreto direttoriale di apertura sportello e definizione termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni.	Conseguito. Pubblicato in GU n.73 del 28-3-2022 il decreto 18 marzo 2022 recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione.	IV/2022 Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari ad almeno il 30% delle risorse stanziare per la misura.
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori					
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	50% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura	Conseguito. Pubblicati i bandi di gara per sette degli otto padiglioni. Le città interessate sono: Rovigo, Vigevano, Viterbo, Civitavecchia, Perugia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara, Reggio Calabria (Arghillà). Per quest'ultima non è stato ancora pubblicato il bando.	II/2022 - 50% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; - 50% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura.
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	75% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura	Conseguito. IPM Roma Casal del Marmo - ristrutturazione Edificio C "Ex accettazione": incarico di progettazione fattibilità tecnico economica affidato a seguito di indagine di mercato in data 26 gennaio 2022. Torino complesso "Ferrante Aporti": trasmissione degli atti per la pubblicazione in GUUE in data 30 marzo 2022. Complesso demaniale di Bologna "il Pratello":	II/2022 - 75% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; - 25% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura.

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				pubblicazioni avvenute tra il 24 ed il 28 gennaio 2022. IPM Airola: pubblicazione prevista in aprile 2022.	
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MIPAAF	1.203,30	Pubblicazione bandi altri settori Obiettivo del IV/2021 in ritardo: Pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare (e florovivaistico)	Non conseguito. Con decreto dipartimentale 146887 del 30 marzo 2022 sono state ripartite le risorse come segue: - 690 milioni all'attuazione di un nuovo avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera nel settore agroalimentare; - 350 milioni per i provvedimenti attuativi di scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi nell'ambito del IV bando 2015-2020, già destinate con decreto prot. n. 478546 del 28 settembre 2021 in ottemperanza all'obiettivo del III trimestre 2021; - 103,3 milioni all'attuazione di un nuovo avviso pubblico per il sostegno ai contratti di distretto nel settore agroalimentare; - 50 milioni all'attuazione di un avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore della pesca e dell'acquacoltura; - 10 milioni all'attuazione di un avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore forestale. Quanto agli altri settori, i bandi non sono stati ancora pubblicati. In merito alla scadenza del trimestre precedente, il ritardo non è stato recuperato e il V bando per il settore agroalimentare non risulta ancora pubblicato. Inoltre, il decreto citato ha destinato	I/2023 Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari settore agroalimentare

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al I trimestre 2022	Stato obiettivo al 31 marzo 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				ulteriori 103,3 milioni ad un ulteriore bando per il settore agroalimentare, anche questo non ancora adottato.	
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	Nessun adempimento	In data 28 gennaio 2022 è stato adottato il Decreto interministeriale n. 142 (MUR-SALUTE) recante adozione delle "Linee Guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d.l. n. 59 del 2021)" finalizzate a definire contenuti, requisiti, modalità e finalità di intervento delle singole procedure del PNC nell'ottica di garantire la più ampia ed efficace partecipazione alle iniziative e assicurare la massima qualità delle proposte presentate.	II/2022 Pubblicazione da parte del MUR del primo bando (in due finestre) per il finanziamento di progetti di ricerca; Apertura della prima finestra del primo bando

