



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

PNC

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 4: adempimenti e attività al 30 giugno 2022

2020

2021

2022

2023



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 4: adempimenti e attività al 30 giugno 2022

INDICE

CAPITOLO 1 - Il trimestre 2022 - Il dettaglio.....	1
CAPITOLO 2 - I programmi con criticità relative a tempistiche per l'autorizzazione UE.....	5
Allegato 1	7
Programmi e interventi del PNC.....	7
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.....	7
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	8
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	8
B.1.2 - Rilancio economico e sociale	8
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	8
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi.....	8
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:.....	9
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi.....</i>	<i>9</i>
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>	<i>9</i>
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:.....	9
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi.....</i>	<i>9</i>
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	<i>10</i>
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:	10
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i>	<i>10</i>
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln).....</i>	<i>10</i>
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	10
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:.....	10
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:	11
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri.....</i>	<i>11</i>
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari.....</i>	<i>11</i>
C.4.2 - Mezzi intermodali:.....	11
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	<i>11</i>
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):	12
C.5.1 - Ponti e viadotti.....	12
C.5.2 - Smart Road.....	12
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	12
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale.....	13
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	13
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale	13
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	14

C.10 - Efficiamento energetico	14
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	14
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne	15
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	15
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	15
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:	16
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	16
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	16
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima.....	17
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.....	17
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.....	17
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	18
E.3 - Ecosistema innovativo della salute.....	18
F.1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale	19
F.3 - Accordi per l'Innovazione	19
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori	20
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni “modello” per detenuti adulti	20
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	20
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.....	20
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale..	21


CAPITOLO 1 - Il trimestre 2022 - Il dettaglio

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al secondo trimestre dell'anno 2022 per l'attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come individuati nell'Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021.

L'aggiornamento è stato predisposto sulla base delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni titolari degli investimenti.

Alla scadenza del **30 giugno 2022 (T2 2022)**, nel DM MEF sono previsti **29 obiettivi** ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 1.

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

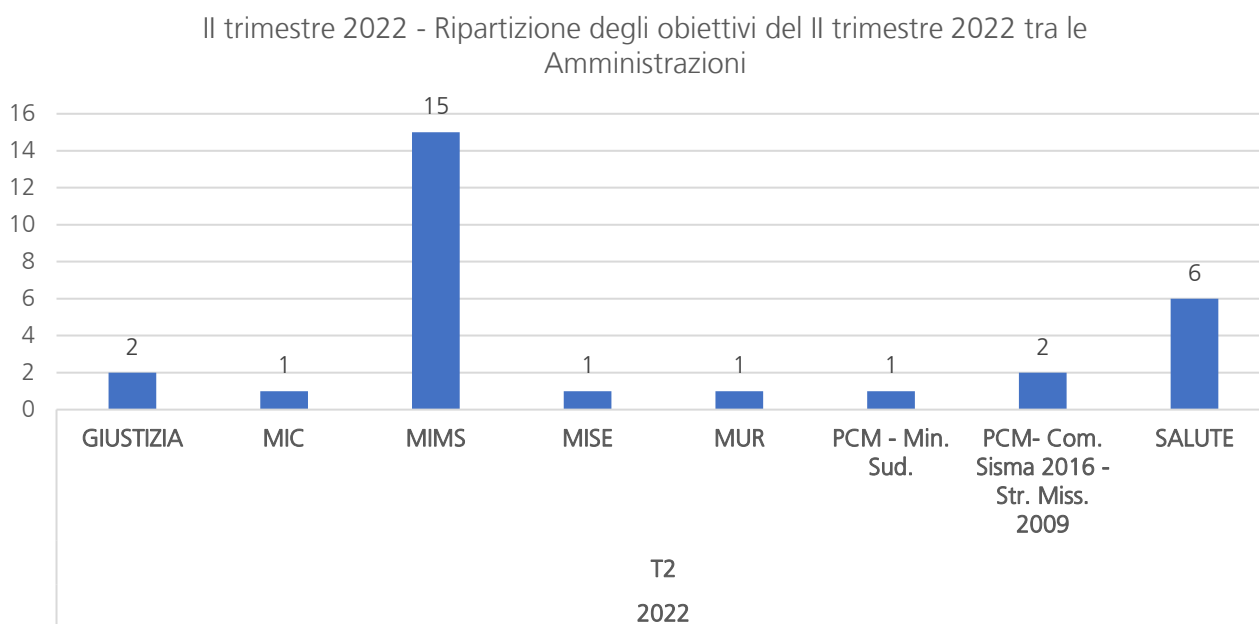

Gli obiettivi relativi al presente trimestre risultano tutti conseguiti, ad eccezione di quelli di seguito rappresentati. Per il dettaglio si rinvia all'allegato 1.

- **Obiettivi parzialmente conseguiti:**
 - *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, per i programmi da C.8 a C.11 (Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale, Efficientamento energetico, Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)): considerando i programmi singolarmente, non sono state raggiunte le percentuali di pubblicazione dei bandi di gara previste nei cronoprogrammi. Si veda, tuttavia, il focus contenuto nel box sotto riportato.
- **Obiettivi non conseguiti:**
 - *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, per l'intervento C.2.1.1 – **Acquisto navi**: la gara, pubblicata nel rispetto dei tempi previsti, è andata deserta. RFI ha pubblicato un nuovo bando sulla GUUE il 21.06.2022 per l'acquisto di due navi con opzione sulla terza.

- *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, per l'intervento **C.4.1.1 - Locomotori e carri**: l'amministrazione è in attesa dell'autorizzazione UE a seguito della quale verrà pubblicato il bando.
- *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, per l'intervento **C.4.1.2 - Raccordi ferroviari**: l'amministrazione è in attesa dell'autorizzazione UE. Non appena conseguita, procederà al trasferimento delle risorse a RFI
- *Ministero dello sviluppo economico*, per il programma **F.1 – "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale**: Poste Italiane ha comunicato di aver pubblicato al 30 giugno 2022 14 bandi per un importo pari a 416,65 milioni di euro, di cui solo due con contratto perfezionato per un valore complessivo di 2,95 milioni di euro. L'autorizzazione UE risulta non ancora pervenuta.

Focus. Programmi sugli interventi portuali

Per i **porti** (programmi da C.7 a C.11), il MIMS ha comunicato che sono stati pubblicati bandi di gara il cui valore complessivo ammonta a 1.006,15 milioni di euro a fronte di un finanziamento complessivo pari a 2.860 milioni di euro (35% del totale).

I relativi cronoprogrammi contenuti nell'allegato 1 al DM MEF del 15 luglio 2021 prevedono per ciascun programma il raggiungimento dell'obiettivo della " *Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori*", eccezion fatta per il programma C.10 per il quale l'obiettivo è la pubblicazione di tutti i bandi di gara.


Sulla base delle informazioni trasmesse, valutando singolarmente i programmi, solo per C.7 l'obiettivo risulta conseguito.

Tuttavia, l'Amministrazione competente ha ritenuto conseguiti gli obiettivi considerando i programmi sui porti nel loro complesso, in coerenza con la natura degli stessi e la disciplina a cui sono sottoposti (si veda il DI MIMS-MEF n. 330 del 2021).

Accedendo, quindi, a tale interpretazione il valore delle opere complessivamente messe a bando (1.006,15 mln di euro) risulterebbe nel complesso superiore alla somma degli importi dei bandi di gara da pubblicare per raggiungere i cinque obiettivi.

Di seguito una rappresentazione grafica dello stato di realizzazione degli obiettivi.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

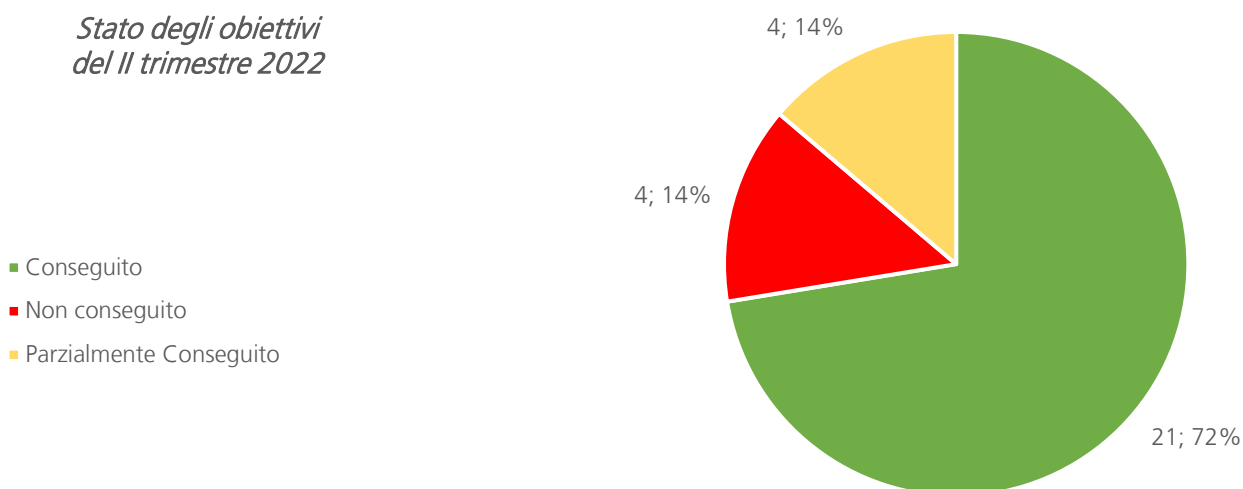

Il quadro di dettaglio per il II trimestre 2022, con separata evidenza – per ogni obiettivo collegato ad ogni singolo intervento – dello stato di tutti gli adempimenti previsti, è contenuto nella tabella di cui all'[allegato 1](#), redatta sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni interessate. Come per il precedente report, la struttura è graficamente predisposta per evidenziare i programmi e le relative suddivisioni:

- **Programma**
- Investimento
- *Intervento*

Le informazioni relative agli obiettivi e agli adempimenti sono associate al livello di suddivisione più basso, ove esistente.

CAPITOLO 2 - I programmi con criticità relative a tempistiche per l'autorizzazione UE

Come rilevabile dalla lettura dei diversi Report trimestrali pubblicati da questa Amministrazione, si evidenziano difficoltà di coordinamento temporale tra i termini per gli adempimenti indicati nell'Allegato 1 del DM MEF del 15 luglio 2021 per i singoli progetti, con quelli richiesti dalle procedure di verifica della Commissione europea in tema di compatibilità con la disciplina sulla tutela della concorrenza.

Nello specifico, si è riscontrato che progetti pre-notificati/notificati ben oltre un semestre fa – si segnalano in particolare le pre-notifiche effettuate per il programma F.1 - POLIS in data 19 luglio 2021 e per l'intervento C.4.1.1 - Locomotori e carri in data 9 settembre 2021 - non hanno ancora ricevuto un riscontro definitivo dall'Istituzione sovranazionale, rendendo così incerta l'attuazione dei successivi adempimenti che le Amministrazioni responsabili hanno spesso ritenuto di non porre in essere in attesa del provvedimento unionale.

Appare evidente il particolare rilievo positivo che avrebbe avuto l'estensione anche ai progetti del PNC della procedura accelerata per la decisione sull'approvazione degli aiuti di Stato prevista per i progetti del PNRR, c.d. "fast track".

Premesso quanto sopra, allo stato risulta non ancora pervenuta l'autorizzazione europea per i seguenti programmi e interventi:

Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili:

- C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi:
 - C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:
 - C.2.1.1 - Upgrading nuove navi
 - C.2.1.2 - Retrofit Navi
- C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:
 - C.4.1.1 - Locomotori e carri
 - C.4.1.2 - Raccordi ferroviari

Ministero dello sviluppo economico:

- F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale

Allegato 1

Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	PCM: Min. Sud	350,00	Stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni Obiettivo del I/2022 in ritardo: Provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti	Conseguito. Sono stati firmati due Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale: <ul style="list-style-type: none"> - Decreto n. 214/2022 di approvazione della graduatoria dei 146 progetti valutati dalla Commissione; - Decreto n. 215/2022 di approvazione dell'elenco dei beneficiari destinatari del contributo (n. 27 progetti completi di CUP e ammontare di contributo concedibile). È stato recuperato il ritardo del trimestre precedente e, al 30 giugno, sono state sottoscritte dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale tutte le 27 convenzioni e trasmesse a tutti i soggetti proponenti.	III/2022 Pubblicazione di tutti i bandi di gara e aggiudicazione per almeno 2 HUB

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016					
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.	1.080,00	Approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009)	Conseguito. Risultano in corso di approvazione 16 progettazioni su 825 totali, per i quali nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 giugno 2022 è stato previsto quale termine ultimo per l'approvazione il 31 luglio 2022.	III/2022 Pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara
B.1.2 - Rilancio economico e sociale		700,00	Pubblicazione degli avvisi pubblici/bandi da parte dei soggetti attuatori.	Conseguito. Sono stati pubblicati tutti i bandi di gara. Per la sub-misura b.4 (centri di ricerca per l'innovazione) è stata scelta una procedura diversa. I progetti, i soggetti attuatori e le risorse sono stati individuati mediante protocollo d'intesa e relative convenzioni.	IV/2022 Approvazione da parte dei soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIMS	600,00	Nessun adempimento		III/2022 Sottoscrizione dei contratti
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:					
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi</i> <i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>	MIMS	500,00	Nessun adempimento		III/2022 Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi</i>	MIMS	60,00	Aggiudicazione gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci	Non conseguito. Il ritardo nel conseguimento non dipende dall'Amministrazione né dal soggetto attuatore in quanto la precedente gara, pubblicata nel rispetto dei tempi previsti, è andata deserta. Con lettera del 16.05.2022 il Ministro MIMS ha rappresentato che, in base a quanto comunicato da RFI al MIMS, alla procedura di gara per la realizzazione delle navi citate non sono state presentate offerte in particolare a causa dell'aumento dei costi energetici e per materie prime. RFI ha pubblicato un nuovo	III/2022 Avvio dei lavori di progettazione

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				bando sulla GUUE il 21.06.2022 per l'acquisto di due navi con opzione sulla terza.	
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	MIMS	20,00	Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghetto Messina	Conseguito. La nave Iginia è già entrata in servizio il 7 marzo 2022.	IV/2024 Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:					
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i> <i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)</i>	MIMS	220,00	Nessun adempimento	Ricevuta autorizzazione UE il 6 maggio 2022 (SA.101309 (2021/N)). Il bando per le richieste di finanziamento è stato adottato con DM 27.06.22, n. 191. Il termine per la presentazione delle domande è il 10 settembre 2022.	III/2022 Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	MIMS	1.550,00	Nessun adempimento		IV/2022 Stipula contratti per il 38% dei lavori. Avvio del 38% dei lavori. Pubblicazione bando del 100% dei lavori
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
merci:					
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:					
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIMS	115,00	Individuazione beneficiari locomotori e carri Obiettivo del I/2022 in ritardo: Avvio della procedura di concessione dei contributi	Non conseguito. L'amministrazione è ancora in attesa dell'autorizzazione UE. SA.64726 (DI MIMS MEF n. 395 del 13.10.2021) Il bando è stato predisposto ma la pubblicazione avverrà dopo l'autorizzazione UE che ha richiesto l'adozione di un nuovo decreto che accorpi la misura in esame con altra misura analoga riguardante la rottamazione carri.	III/2022 DM Assegnazione delle risorse per l'acquisto dei mezzi ai beneficiari
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIMS	30,00	Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali	Non conseguito. L'amministrazione è ancora in attesa dell'autorizzazione UE. Non appena conseguita, si procederà al trasferimento delle risorse a RFI.	III/2023 Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma
C.4.2 - Mezzi intermodali:					
<i>C.4.2.1 - Locotrattori,</i>	MIMS	55,00	Individuazione beneficiari mezzi	Conseguito.	III/2022

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>transtainer, gru</i>			intermodali	I soggetti che hanno presentato domanda sono 42, dei quali 29 eleggibili. Sono state inviate le lettere di pre-esclusione alle altre 13 società e il MIMS è in attesa dei relativi chiarimenti.	DM Assegnazione delle risorse per l'acquisto dei mezzi ai beneficiari
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):					
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIMS	1.000,00	Aggiudicazione del contratto per le attività di monitoraggio dinamico	Conseguito. La Commissione aggiudicatrice ha completato le operazioni di gara e il RUP ha approvato la proposta di aggiudicazione in data 05.07.22, con lieve ritardo rispetto a quanto previsto.	III/2022 Redazione del progetto Interventi adeguamento 16 ponti e viadotti Avvio lavori di installazione dispositivi di monitoraggio
C.5.2 - Smart Road	MIMS		Aggiudicazione del contratto	Conseguito. La Commissione aggiudicatrice ha completato le operazioni di gara e il RUP ha approvato la proposta di aggiudicazione in data 05.07.22, con lieve ritardo rispetto a quanto previsto.	III/2022 Avvio dei lavori di installazione dispositivi per smart road
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIMS		Nessun adempimento		IV/2022 Pubblicazione del

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					bando di gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIMS	450,00	Decreto direttoriale di approvazione dei Piani operativi predisposti da Anas Protocolli d'intesa di approvazione dei Piani operativi predisposti dai gestori delle tratte autostradali	Conseguito. È stato pubblicato sulla G.U. del 31.05.22, n. 126 un nuovo DM datato 12.04.22, n. 93, di approvazione del riparto delle risorse. È stato emanato il decreto direttoriale del 04.07.22, n. 739 di approvazione del piano operativo predisposto da ANAS. Il 24 giugno 2022 sono stati sottoscritti i protocolli d'intesa contenenti i piani operativi predisposti dai concessionari autostradali beneficiari del contributo.	IV/2022 Avvio procedura di affidamento dei lavori
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIMS	1.470,00	Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori.	Conseguito. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1.	IV/2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori
C.8 - Aumento selettivo della	MIMS	390,00	Pubblicazione da parte delle	Parzialmente conseguito.	IV/2022

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
capacità portuale			Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori	Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1.	Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIMS	250,00	Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori	Parzialmente conseguito. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1.	IV/2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori
C.10 - Efficiamento energetico	MIMS	50,00	Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori	Parzialmente conseguito. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1.	I/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	MIMS	700,00	Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori.	Parzialmente conseguito. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1.	IV/2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne	MIMS	300,00	Approvazione dei Piani di intervento da parte delle Autorità centrali	Conseguito. La DG competente del MIMS ha approvato i piani di intervento presentati dalle 72 aree interne.	III/2022 Predisposizione dei progetti da parte dei S.A.
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIMS	2.000,00	Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi	Conseguito. Con DD del 30.06.22, n. 8158 sono state approvate modifiche al Piano degli interventi di cui all'allegato A del DD n. 52 del 30 marzo 2022, richieste dalle regioni Lazio, Piemonte e Sardegna. È stata affidata la progettazione degli interventi di cui all'allegato A del DD n. 52 del 30 marzo 2022.	III/2022 Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	Pubblicazione dei Bandi di gara per appalto lavori e servizi per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.	Conseguito. L'amministrazione titolare ha adottato un accordo quadro, individuando Invitalia quale centrale di committenza, al quale hanno aderito 11 dei 14 soggetti attuatori. Nel complesso dei 150 interventi previsti, 105 rientrano	IV/2022 Aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				nell'accordo quadro citato grazie al quale sono stati pubblicati bandi di gara per circa 630 milioni di euro, oltre il 43% delle risorse.	
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:					
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	<p>Provvedimento di assegnazione delle risorse per la realizzazione delle opere di istituzione/rafforzamento di strutture nazionali, regionali e territoriali con competenze e responsabilità specifiche in salute-ambiente-clima (Piano di azione SNPS SNPA).</p> <p>Aggiudicazione del bando di gara per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA).</p> <p>Provvedimento di istituzione del SNPS.</p>	<p>Conseguito.</p> <p>Assegnate le risorse e sottoscritte convenzioni con le quattro ARPA capofila e con l'ISPRA.</p> <p>Il SNPS è stato istituito con l'art. 27 del decreto-legge n. 36/2022</p>	I/2023 Pubblicazione bando, aggiudicazione (entro 3 mesi successivi) e avvio interventi (entro 3 mesi successivi): per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	Nessun adempimento		IV/2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati di promozione della salute, sorveglianza attiva e assistenza sanitaria e sistemi di

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					comunicazione partecipativa delle comunità.
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS Provvedimento di istituzione del SNPS	Conseguito. Il Piano di azione è stato sottoscritto in data 30/12/2021. Adottato D.D. del 14 luglio 2022 contenente il Piano di azione per la formazione di livello universitario. Il SNPS è stato istituito con l'art. 27 del decreto-legge n. 36/2022	IV/2023 Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento di infrastrutture, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso l'ISS
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	Pubblicazione bando	Conseguito. Il bando è stato pubblicato con data 30 giugno 2022	III/2022 Aggiudicazione
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	Piano di azione MdS-ISS	Conseguito. Il Piano di azione è stato sottoscritto in data 30/12/2021. Adottato il D.D. del 14 luglio 2022 contenente la pianificazione per lo sviluppo di una piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA	II/2023 Provvedimento di adozione Piano di Digitalizzazione della rete SNPS e SNPA

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	Decreto ministeriale di approvazione del piano d'azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni	Conseguito. A fine maggio sono stati sottoscritti tutti i CIS tra le amministrazioni regionali e il Ministero della Salute. Costituiscono parte integrante dei CIS, i Piani Operativi Regionali (POR), contenenti gli Action Plan per ciascun investimento con l'indicazione degli interventi necessari e l'assegnazione delle relative risorse per Regione, le schede intervento predisposte dalle Regioni e compilate sulla piattaforma informatica messa a disposizione da AGENAS. La stipula dei CIS è stata formalizzata in apposito Decreto Ministeriale riepilogativo che attesta l'avvenuta firma dei contratti.	I/2023 Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn
E.3 - Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	Pubblicazione ed espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per: - la creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore; - il rafforzamento dei Life	Conseguito. In merito a: - Network Trasferimento Tecnologico - Life Science HUB Nell'ambito del relativo avviso pubblico, contenuto nel D.D. della DGRIC del 30/03/2022, la cui fase di selezione si è conclusa	IV/2022 Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria; - la creazione di un Polo Anti-Pandemia.	il 9 giugno 2022, sono state presentate 128 espressioni di interesse. Quanto alla creazione del polo anti-pandemico, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha previsto l'istituzione della Fondazione «Biotecnopolo di Siena» (articolo 1, commi da 945 a 950) assegnando a tale Fondazione le funzioni di Hub antipandemico previste dalla legge n.59 del 2021. Lo statuto è in corso di adozione.	
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MISE	800,00	Aggiudicazione gare appalto Obiettivo del I/2022 in ritardo: Pubblicazione dei bandi di gara Obiettivo del IV/2021 in ritardo: autorizzazione UE.	Non conseguito. Poste Italiane ha comunicato di aver pubblicato 14 bandi per un importo pari a 416,65 milioni di euro, di cui solo due con contratto perfezionato per un valore complessivo di 2,95 milioni di euro. L'autorizzazione UE risulta non ancora pervenuta.	III/2022 Realizzazione interventi pilota
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MISE	1.000,00	Nessun adempimento		IV/2022 Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari ad almeno il 30% delle

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					risorse stanziare per la misura.
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori					
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	50% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; 100% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura.	Conseguito. Già al trimestre precedente risultavano pubblicati i bandi di gara per sette degli otto padiglioni. È stato pubblicato anche l'ultimo bando per la città di Reggio Calabria (Arghillà). Sono stati aggiudicati i bandi di gara per quattro degli otto padiglioni: Civitavecchia, Viterbo, Perugia, Reggio Calabria.	III/2022 50% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	75% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; 100% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura.	Conseguito. Risultano pubblicati tutti i bandi di gara (Airolo, Torino, Bologna, Roma). Sono stati aggiudicati i bandi di gara per gli interventi di Roma, Torino e Bologna.	III/2022 25% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,	MIPAAF	1.203,30	Nessun adempimento Obiettivo del I/2022 in ritardo:	In merito ai ritardi sui trimestri precedenti: - Recuperato il ritardo sul IV/2021. Il 22.04.2022 è stato	I/2023 Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
floricoltura e vivaismo			<p>Pubblicazione bandi altri settori</p> <p>Obiettivo del IV/2021 in ritardo: Pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare (e florovivaistico)</p>	<p>pubblicato il Quinto bando per i contratti di filiera per il settore agroalimentare con avviso prot. 182458 del 22.04.2022 (690 mln).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parzialmente recuperato il ritardo sul I/2022 in quanto il bando per il settore pesca e acquacoltura (50 mln) è stato pubblicato in data 26.07.2022 con Decreto direttoriale n. 300946 del 6.7.2022. - Non recuperato il ritardo sul I/2022 per i contratti di distretto settore agroalimentare (103,3 mln) in quanto non risulta pubblicato alcun bando, così come risulta non ancora pubblicato il bando per il settore forestale (10 mln). <p>Allo stato, dunque, risultano non pubblicati bandi per 113,3 milioni di euro.</p>	<p>finanziari settore agroalimentare</p>
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	<p>Pubblicazione da parte del MUR del primo bando (in due finestre) per il finanziamento di progetti di ricerca</p> <p>Apertura della prima finestra del primo bando</p>	<p>Conseguito.</p> <p>L'amministrazione competente ha optato per l'adozione di unico bando.</p> <p>Con decreto del direttore generale della Direzione Generale della Ricerca del MUR n. 931 del 6 giugno 2022 è stato adottato</p>	<p>IV/2022</p> <p>Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del primo bando</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al II trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 giugno 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>l'avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale con il quale è stata messa a bando l'intera dotazione finanziaria del programma.</p> <p>La finestra per la presentazione delle proposte è compresa tra le ore 12.00 del 1° luglio 2022 le ore 12.00 del 19 agosto 2022</p>	

